

Soepel samenwerken Kabels en Leidingen

*Renée Lameijer (PZH - DBI)
en Eric Van Can (Dunea)*

12 april 2019



provincie **HOLLAND**
ZUID

PROVINCIEHUIS

De boodschap

1. Lang intensief traject met 2 concrete eindproducten:
 - Uitvoeringsprotocol (UP)
 - Aangepaste nadeelcompensatieregeling (NKL-ZH 2019)
2. Het gaat uiteindelijk om een soepele uitvoeringspraktijk:
 - Sturen op de bedoeling van het UP
 - Op naar samen continu verbeteren
3. Gestage groei van vertrouwen

Opbouw

- Voorgeschiedenis
- Proces van verleggingen / Uitvoeringprotocol (+)
- Nadeelcompensatie
- Het vervolg

Chronologie in hoofdlijnen (1)

2010 t/m 2013:


- NKL-ZH 2010
- > 2010 (relatief) veel gedoe en bezwaren; PZH ging verleggingen steeds meer als toprisiko in projecten zien
- 12 juli 2013: Brief van Oasen/Evides/Dunea: verzoek evaluatie NKL-ZH 2010

30 oktober 2013: start SOP (netwerk bijeenkomsten); leverde 3 thema's

- Vroegtijdig afstemmen plannen
- UP
- NKL

2015 + 2016

- Dec. 2014: start 'werkgroep' UP met onafhankelijk procesbegeleider; incl. KPN
- Dec 2015: Brief van netbeheerders met verzoek om in overleg te treden over NKL-ZH 2010
- Dec 2016: eindresultaat UP




Chronologie in hoofdlijnen (2)

2017

- Invoering UP-2016 bij PZH
- Gesprekken tussen PZH en netbeheerders over NKL-ZH 2010
- Onderhandelingsresultaat evaluatie NKL-ZH 2010 (24/10)
- Jaarverslag bezwarencommissie PZH: wens om duidelijke regeling

2018:

- Afronding NKL-ZH
- UP+



Betrokken partijen

gasunie



VELIN

VERENIGING VAN LEIDINGEIGENAREN IN NEDERLAND


evides
waterbedrijf

STEDIN.NET

oasen
drinkwater



Westland 
energy solutions

dunea 
DUIN & WATER


provincie
ZUID HOLLAND

liander


Het Uitvoeringsprotocol

- Wat is de bedoeling:
 - Samenwerken om soepel te verleggen (indien nodig);
 - Synchroniseren van projectmatig werken van netbeheerders en PZH;
 - Werken volgens de geest v/h protocol en niet volgens de letter;

*Gebaseerd op NKL 1999/SKL 2001 (RWS)



Hoofdopzet UP

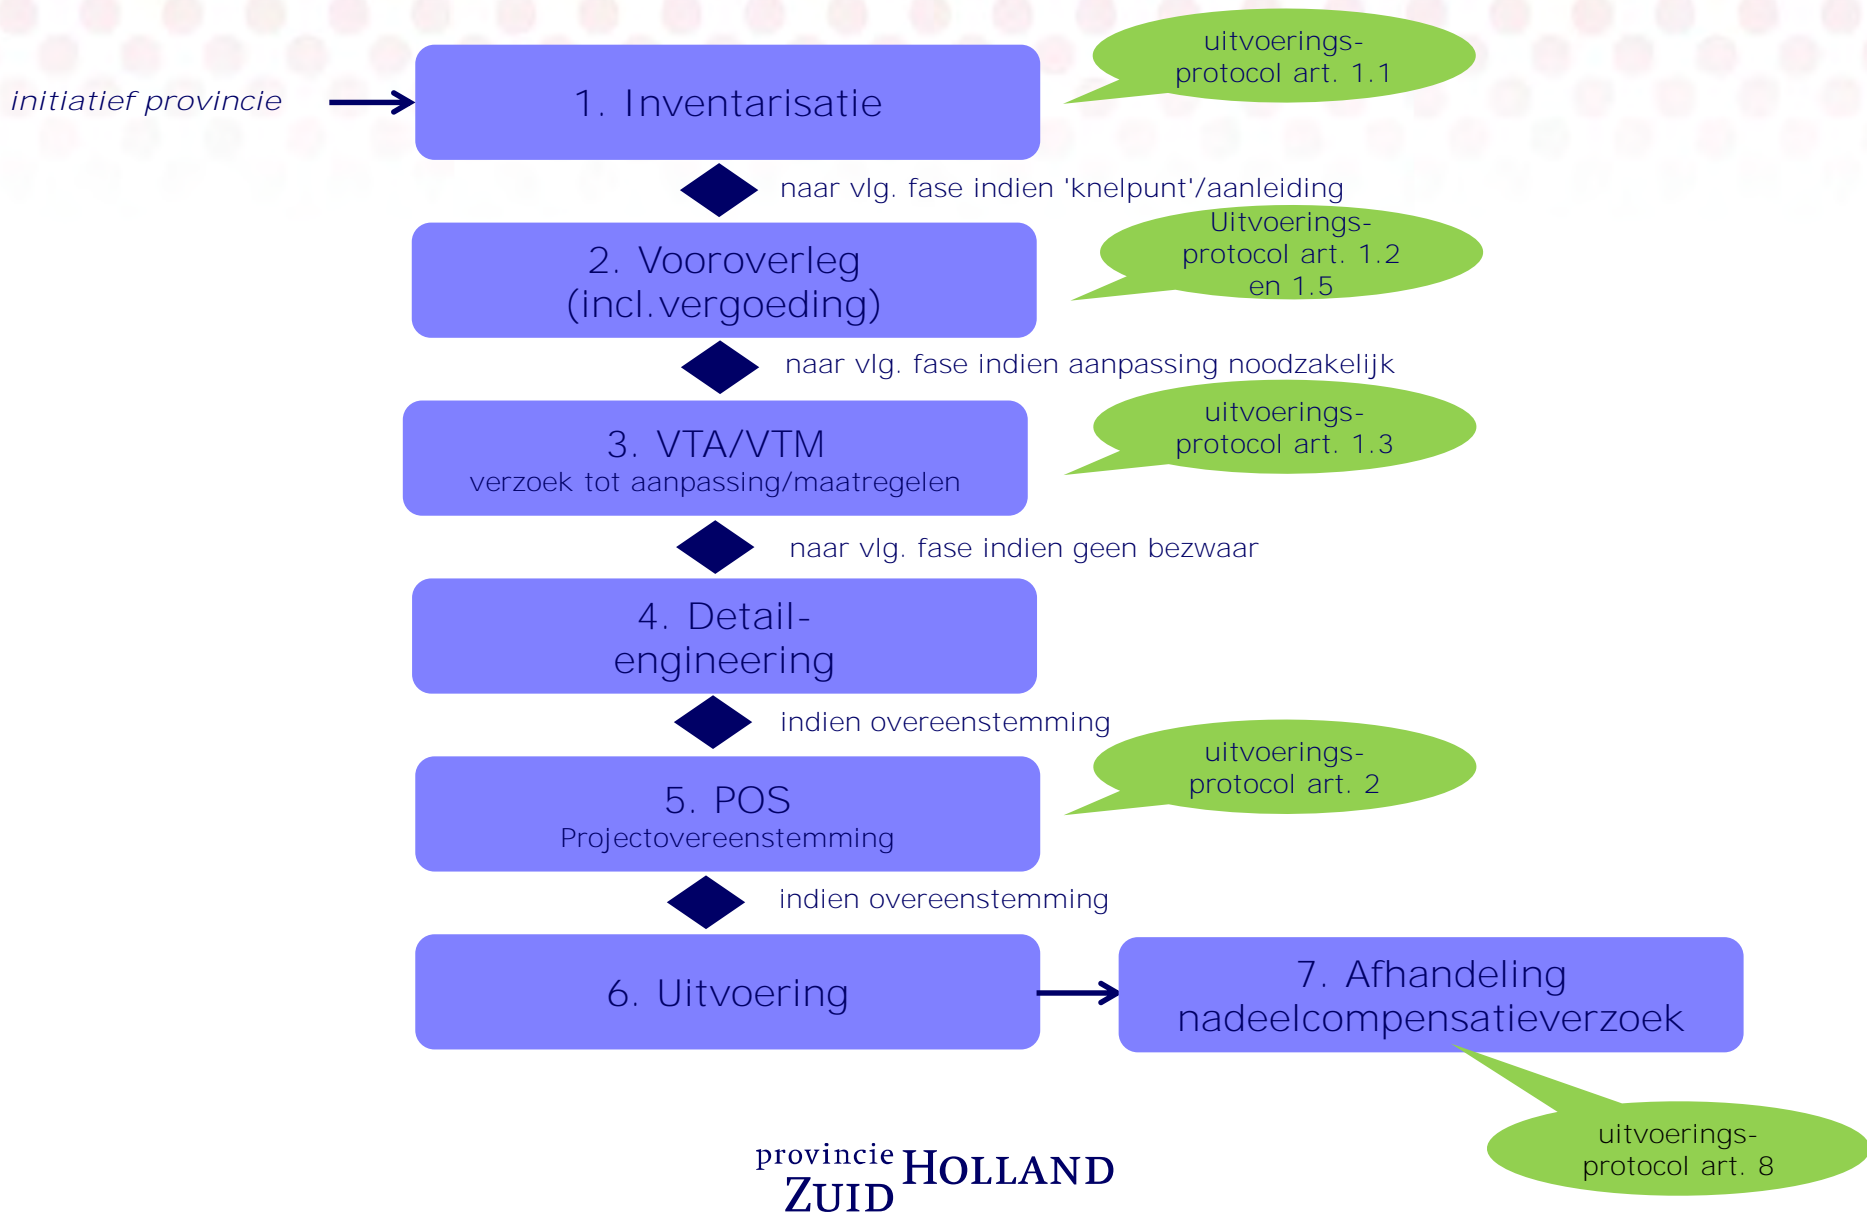

UP akkoord; en de NKL dan ?

- 2016: akkoord over concept UP;
- PZH gestart met interne implementatie;
- Start gesprekken PZH-netbeheerders over NKL;
- 2017: Onderhandelingsresultaat (okt);
- Jaarverslag 2017 bezwarencommissie PZH;
- Tekstuele detaillering NKL en doorpakken UP;
- 2019: van UP naar UP+ (febr).



Uitgangspunten NKL en UP ZH 2019

Onderhandelingsresultaat oktober 2017:

- a. Vergoedingsregime voor kruisende leidingen conform IPO-model:
“vergoeding voor werkelijke uitvoeringskosten en kosten voor ontwerp en begeleiding, ongeacht de leeftijd van de betreffende ontheffing, tenzij de kabel of leiding technisch versleten is.” in de NKL-ZH
- b. Toepassen, bekrachtiging en uitrollen UP K&L
- c. Terughoudend omgaan met verlegging van bijzondere leidingen in UP K&L
- d. Toevoeging van een tekstvoorstel voor ‘commerciële belangen’ in de toelichting op de nadeelcompensatieregeling NKL-ZH
- e. Ook ‘we agree to disagree’, maar willen wel graag met elkaar verder

Uitgangspunten NKL-ZH 2019

Leesbaarheid:

- *Jaarverslag 2017 Bezwarencommissie PZH: “In een ander advies in 2017 heeft de commissie gewezen op diverse onduidelijkheden in de artikelen 1, 3, 4 en 5 van de Regeling nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2010 (NKL-ZH 2010). Zij heeft aanbevolen de formulering zo te verhelderen dat over bedoeling en inhoud van die artikelen niet langer verwarring en misverstanden kunnen ontstaan.”*

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Zuid-Holland 2019

- Vastlegging van het proces en afspraken:
“Samenwerken om soepel te verleggen”
- Nieuw in UP+:
 - Wederzijdse binding
 - Aanvullingen:
 - 1.6: Terughoudend omgaan met bijzondere leidingen
 - 10.2: In beginsel niet in bezwaar en beroep, maar escalatie op management niveau en daarna bestuurlijk niveau.

**WAAROM
MOEILIK DOEN
ALS
HET SAMEN KAN**

Loesje

POSTBUS 1041

6411 SA ARNHEM

GROESBEKE

Ondertekening op 12 april!

Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Zuid-Holland 2019

“Samenwerken om soepel te verleggen”



mevrouw M.T.G. van Vuuren - Sanders



de heer W. Drossaert



mevrouw A.M. Ottolini



de heer F. Driessen



de heer F. Vermeulen



de heer W. van der Meer



mevrouw C.M.B. Hoogeveen



de heer. P. Langerels

Beleidsregel Nadeelcompensatie kabels & leidingen Zuid-Holland 2019

- Nieuwe beleidsregel is in werking!
- Standaard werkwijze voor de beslissing over toekennen van nadeelcompensatie aan netbeheerder:
 - Berekeningsstelsel
 - Procedure (aanvraag, etc.)




NKL-ZH 2019


Kruisend toen én nu

2010:

Droge infrastructuur, kruisende leidingen:

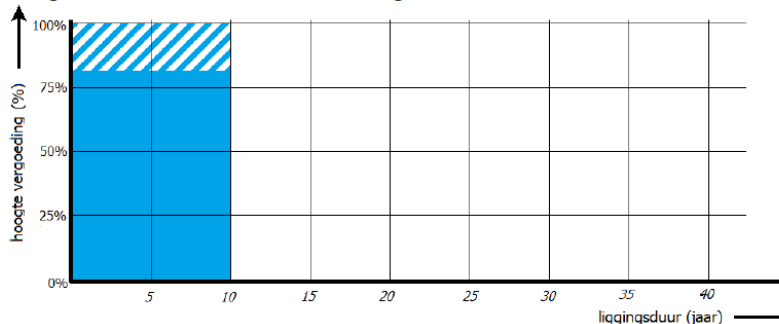


Natte infrastructuur, kruisende leidingen:

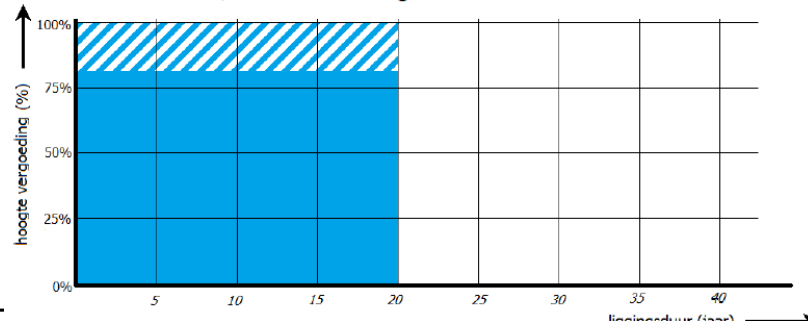

2019:

Kruisende leidingen:

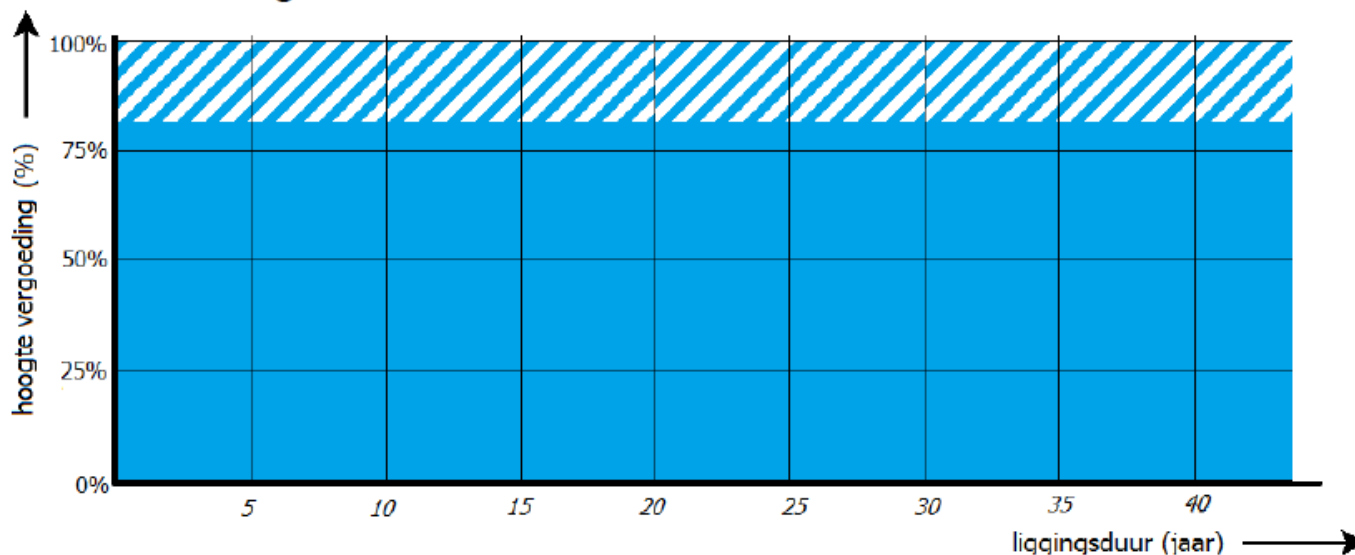

Businesscase PZH

- Investering: het kost de PZH meer geld!
- Winst op soepele projecten:
 - Minder bezwaren/beroepsprocedures
 - Minder vertraging in projecten
 - Een toprisico gemitigeerd!



En hoe nu verder ?

1. Afronden UP Telecom
2. In overleg over gezamenlijke implementatie:
 - Roadshow
 - K&L coördinator PZH
3. Begeleidingsgroep met netbeheerders en PZH: sturen op de bedoeling (geen projectescalaties)



De boodschap

1. Lang intensief traject met 2 concrete eindproducten:
 - Uitvoeringsprotocol (UP)
 - Aangepaste nadeelcompensatieregeling (NKL-ZH 2019)
2. Het gaat uiteindelijk om een soepele uitvoeringspraktijk:
 - Sturen op de bedoeling van het UP
 - Op naar samen continu verbeteren
3. Gestage groei van vertrouwen
